ID	Merk	Staaf schets	Dia
S07	8004	1500	8
S07	8006	2000	8
S21	8016	150 / 550 / 550	8
S21	8017	150 / 700 / 700	8
S07	10004	1500	10
S07	10006	2000	10
S07	10007	2500	10
S07	10008	3000	10
S07	10009	3500	10
S07	10011	5000	10
S07	10015	3600	10
S07	10016	4500	10
S07	10018	2200	10
S07	10019	1900	10
S07	12011	5000	12
S21	12015	150 / 1150 / 1150	12

Bij toepassing in milieuklasse XC 1 moeten de dwarsstaven van het voegnet op de schil van de breedplaatvloer gelegd worden. (zie detail)
LET OP BIJ LOSSE STAVEN MIN. 15MM DEKKING!

Bij toepassing in alle overige millieuklassen dient de betondekking t.p.v. de plaatvoegen groter of gelijk te zijn aan 25mm
Hiervoor afstandhouders toepassen.

Milieuklasse XC 1

principe detail wapening op de plaat
t.p.v. een plaatvoeg.



BOVENWAPENING TPV SPARINGEN

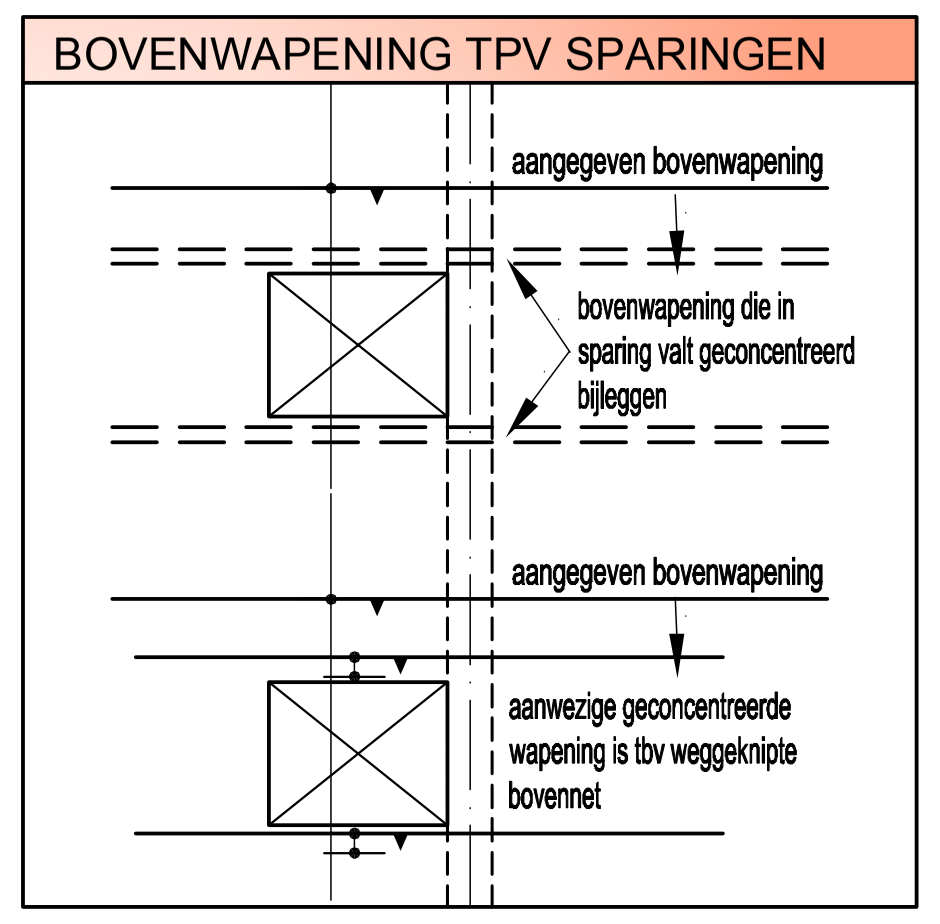
aangegeven bovenwapening
bovenwapening die in sparing valt geconcentreerd bijleggen
aangegeven bovenwapening
aanwezige geconcentreerde wapening is tbv weggeknipte bovennet

BEC-NETTEN

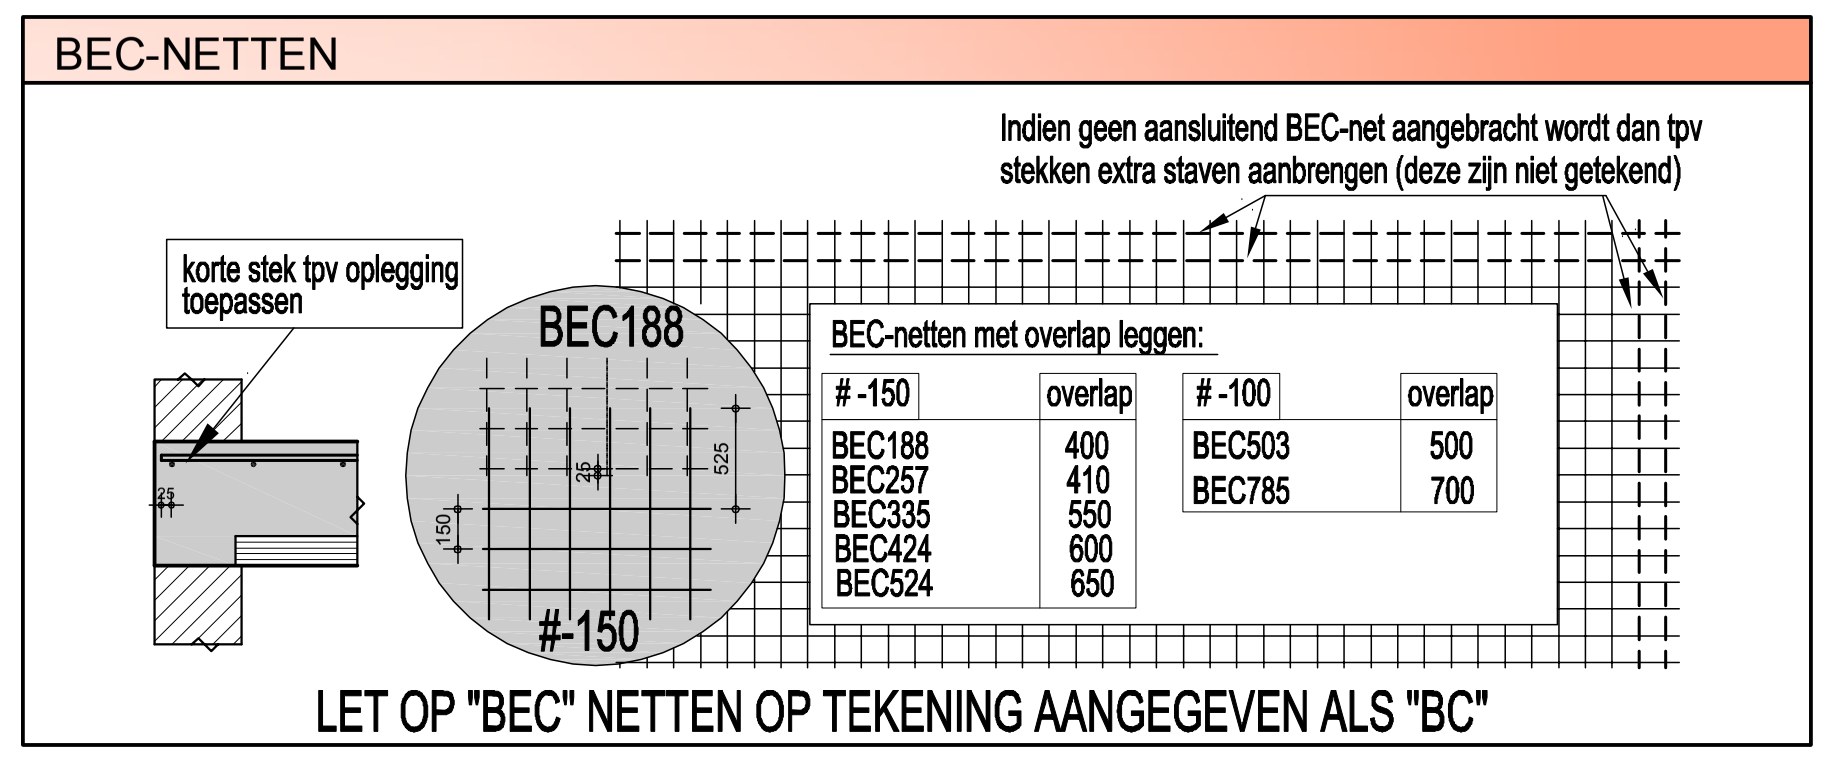
Indien geen aansluitend BEC-net aangebracht wordt dan tpv stekken extra staven aanbrengen (deze zijn niet getekend)
korte stek tpv oplegging toepassen
BEC188
#-150
150
25
525

BEC-netten met overlap leggen:

# -150	overlap	# -100	overlap
BEC188	400	BEC503	500
BEC257	410	BEC785	700
BEC335	550		
BEC424	600		
BEC524	650		

LET OP "BEC" NETTEN OP TEKENING AANGEGEVEN ALS "BC"

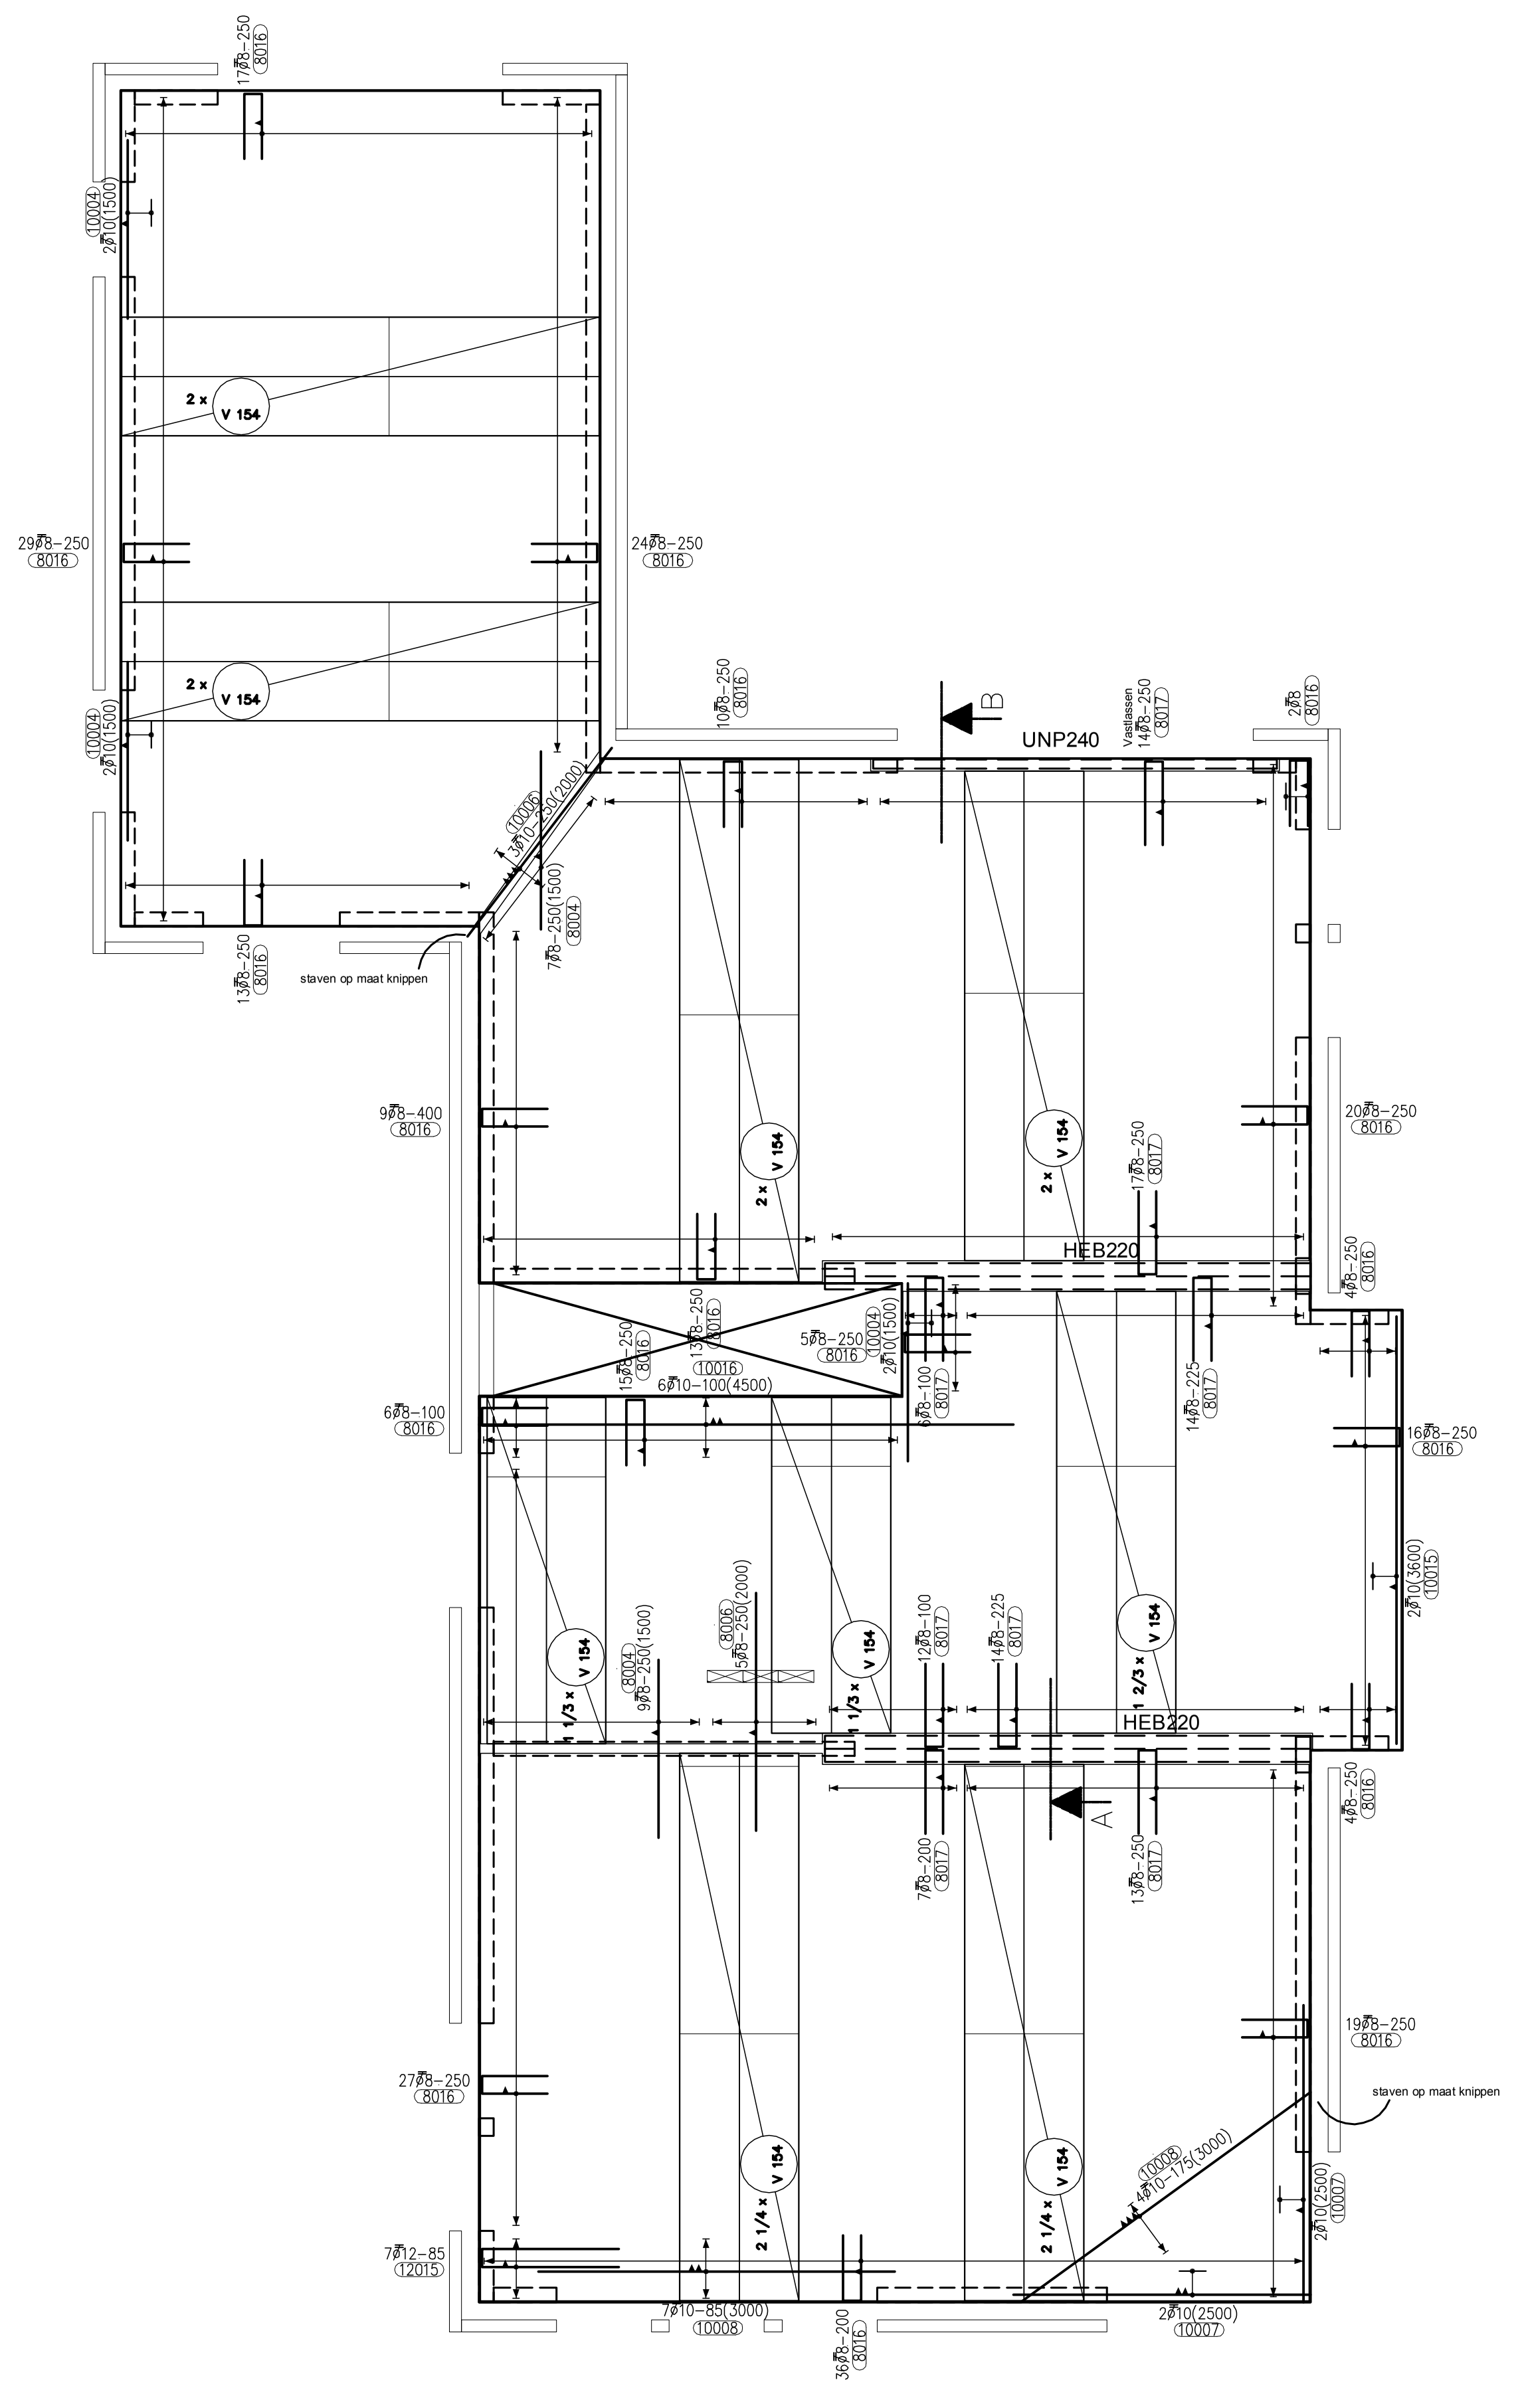

EERSTE VERDIEPING
WAPENING OP DE PLAAT

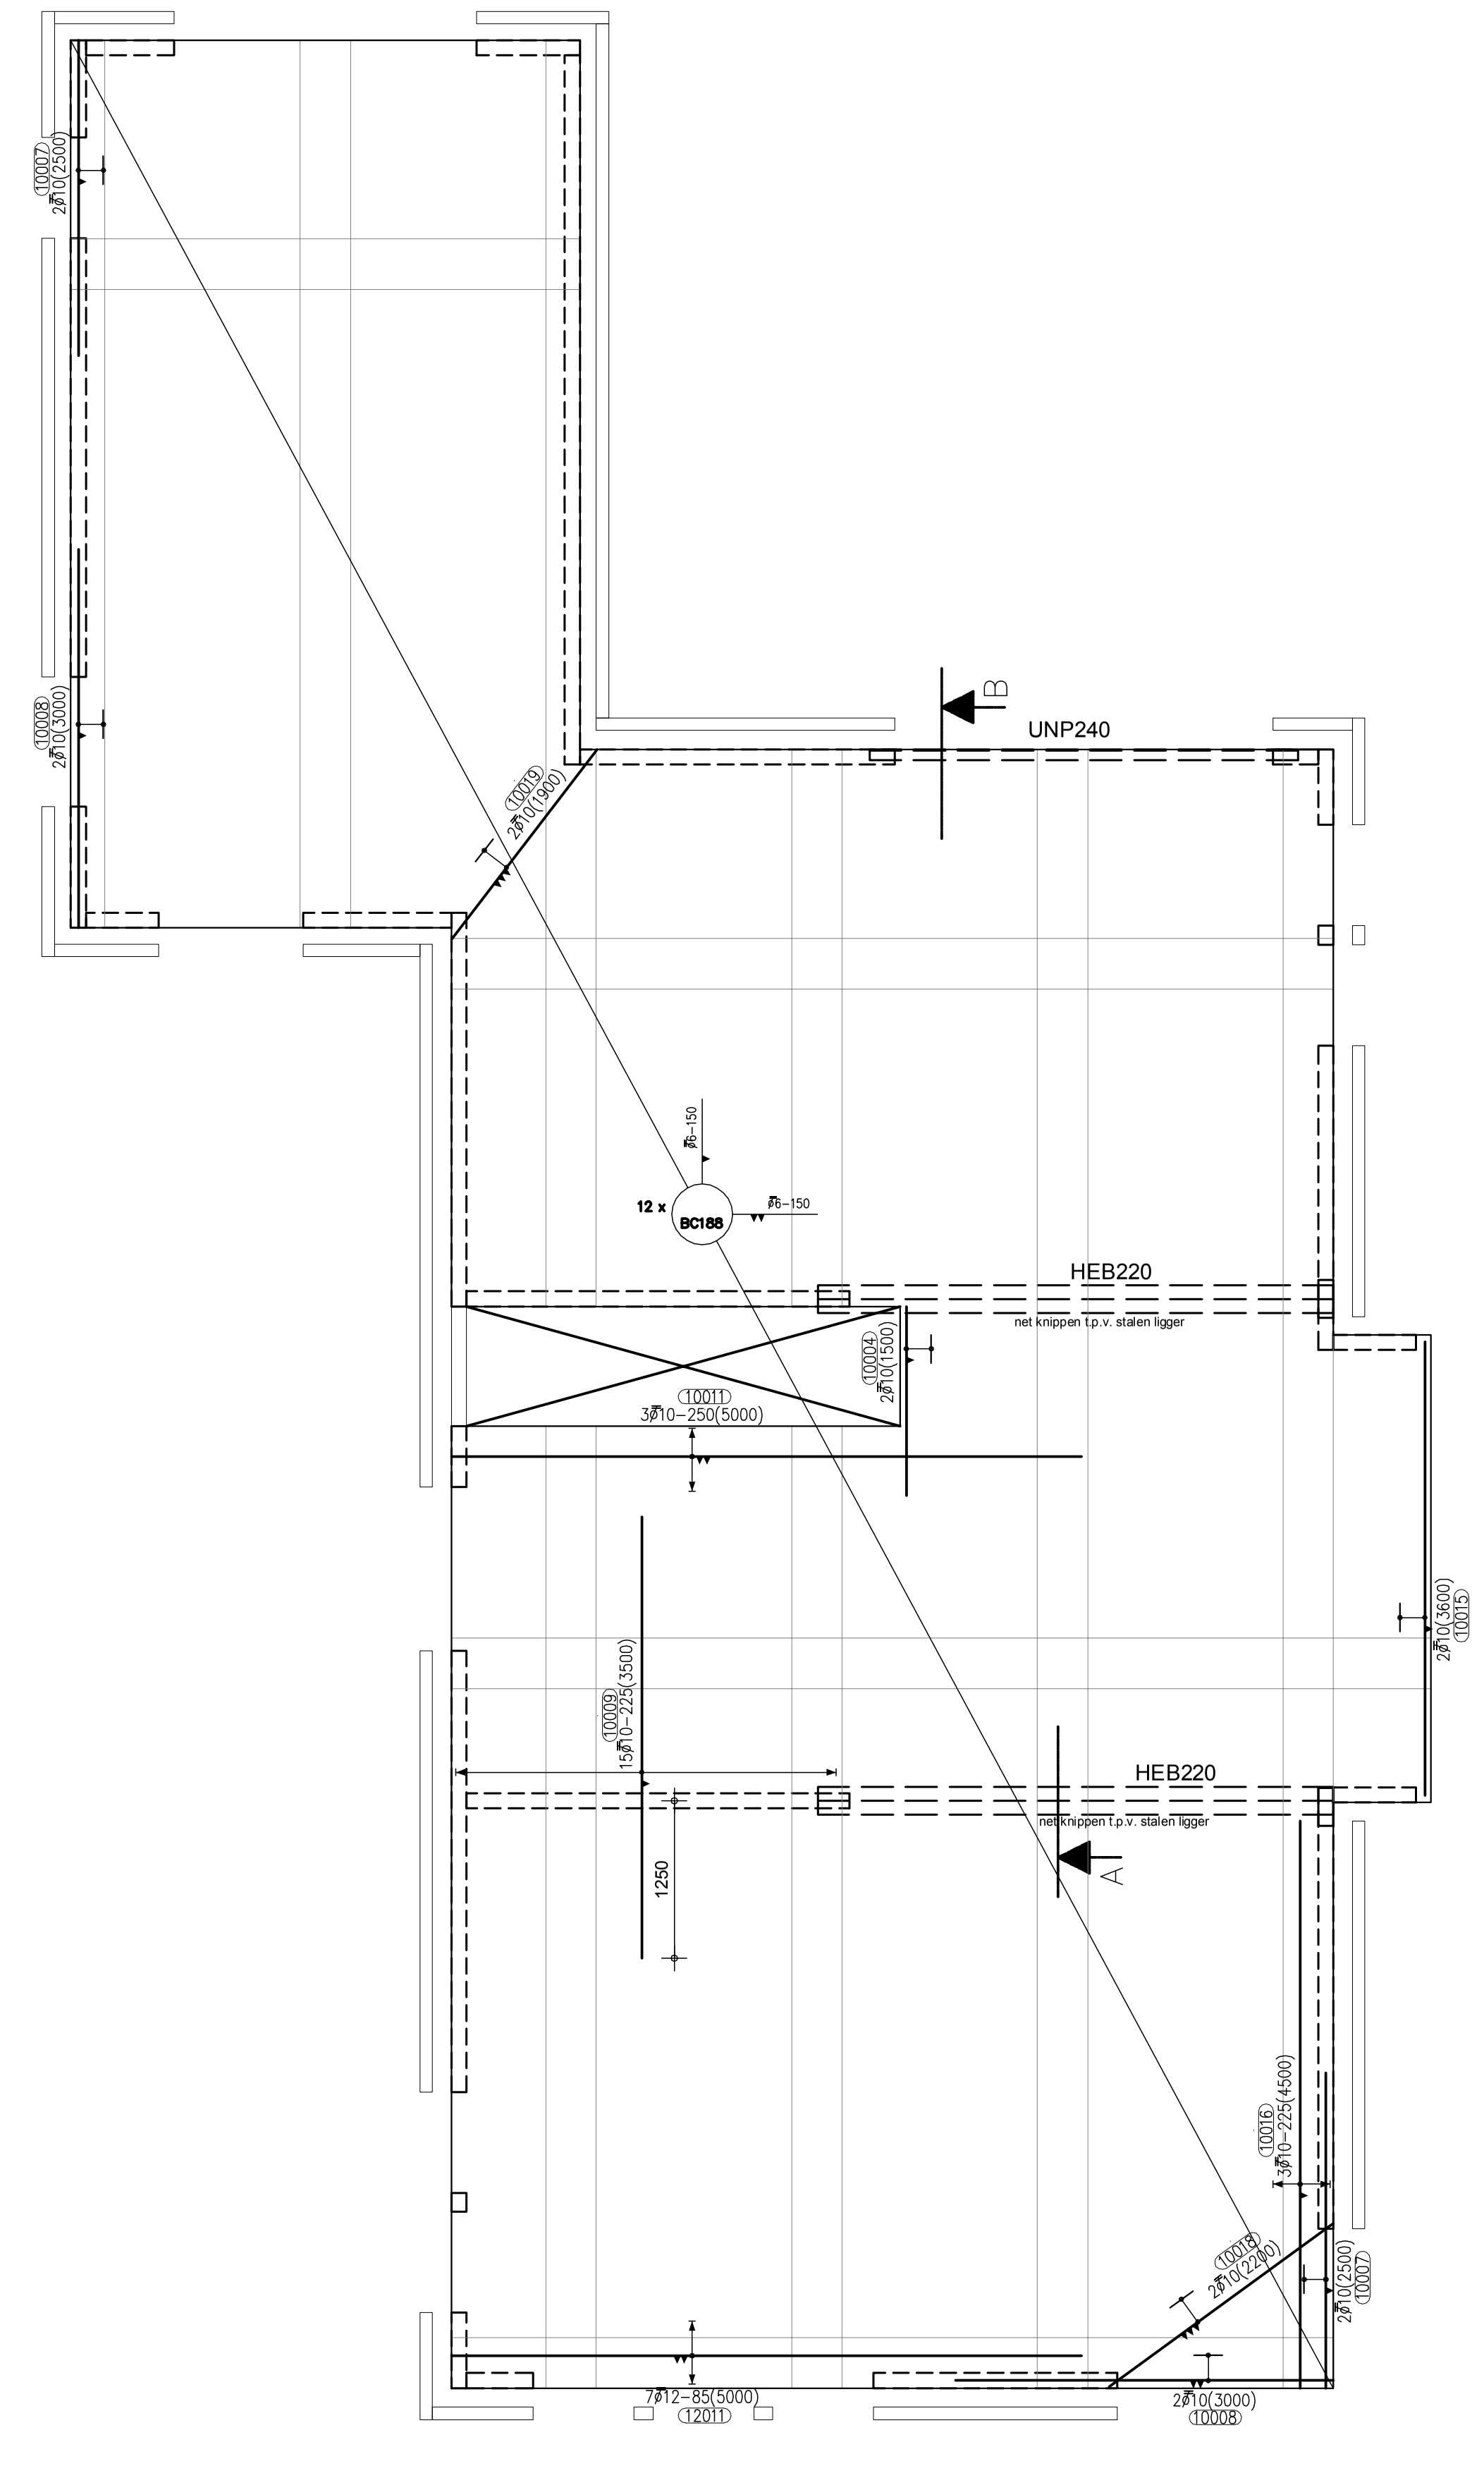

EERSTE VERDIEPING
BOVENWAPENING

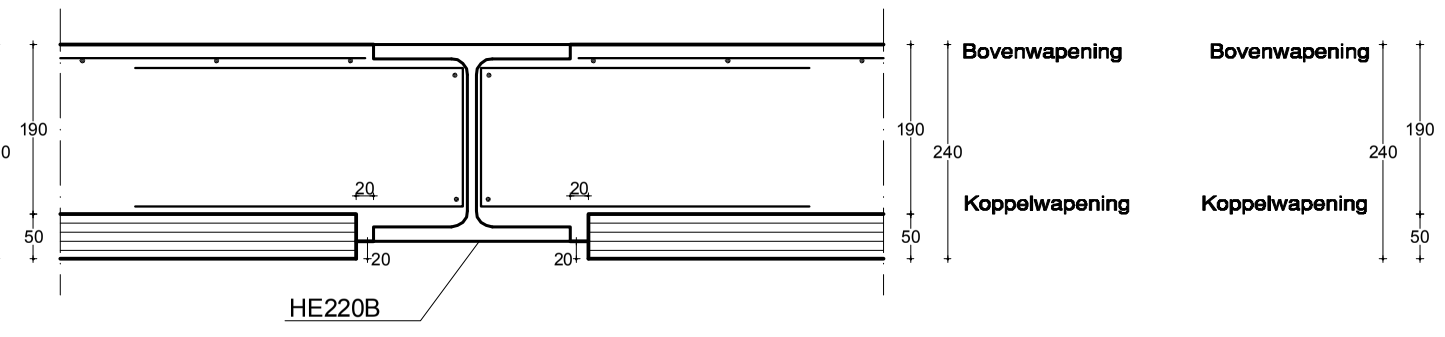
Vloer vrij opgelegd berekenen
Net knippen t.p.v. stalen ligger
Bovenwapening
Koppelwapening
240
190
50
20
HE220B

DETAIL A
Extra wapening vlgns hoofdconstructeur wordt niet getekend/meegeleverd.

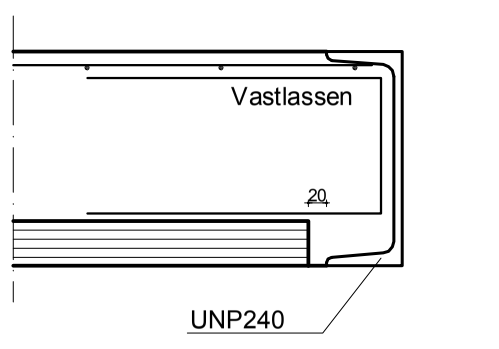

DETAIL B
Extra wapening vlgns hoofdconstructeur wordt niet getekend/meegeleverd.

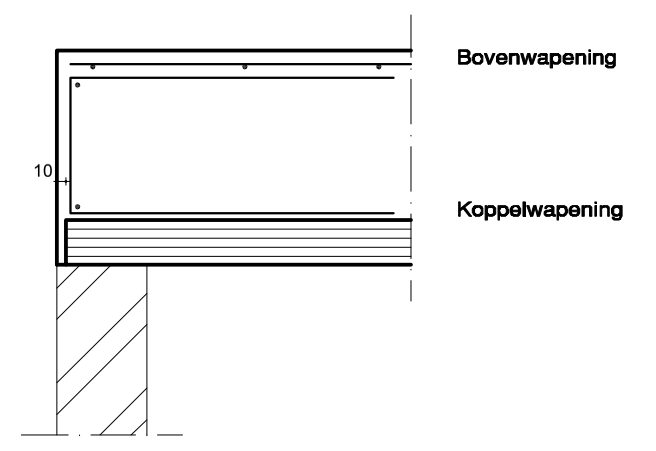

PRINCIPE DETAIL
Dragend metselwerk eindsteunpunt

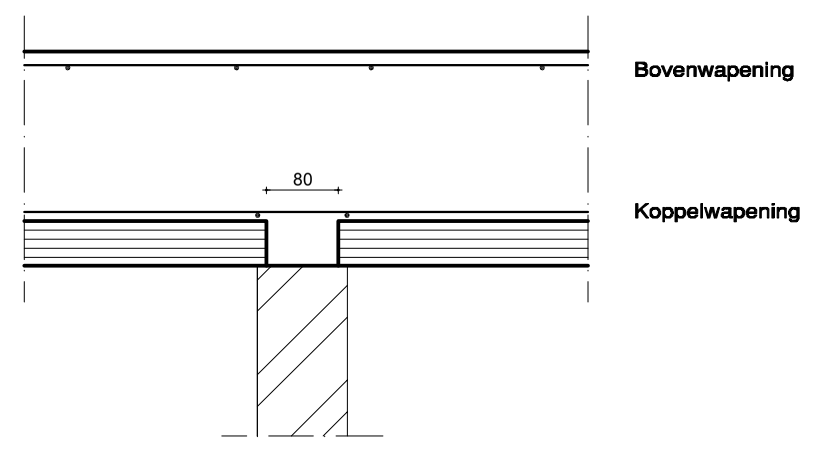

PRINCIPE DETAIL
Dragend metselwerk tussensteunpunt

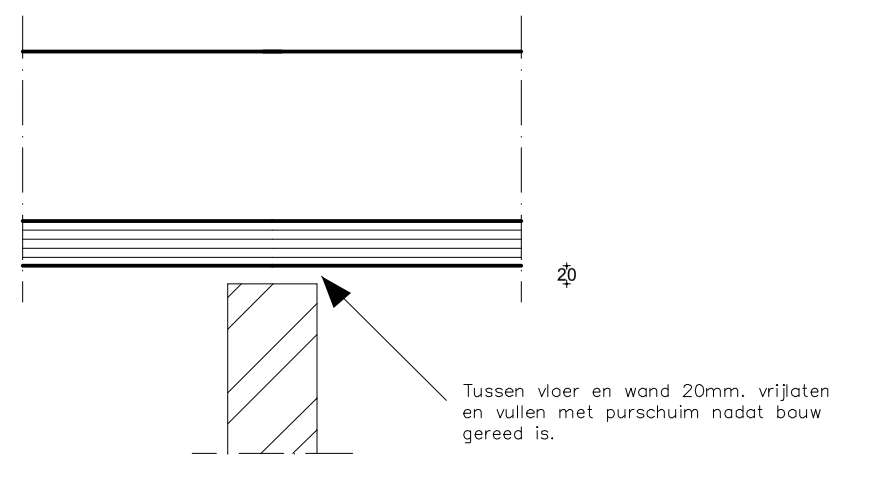
20
Tussen vloer en wand 20mm. vrijlaten en vullen met purschuim nadat bouw gereed is.

PRINCIPE DETAIL
niet dragend metselwerk (N.D.)

BELANGRIJK

Alle maten goed controleren. Niet gewijzigde maten zijn definitief.

Alle taken en verantwoordelijkheden conform categorie 4, criteria 73.

Wenken ten bate van opdrachtgever :

Wij maken u erop attent dat de opdrachtgever ten allen tijde verantwoordelijk blijft voor het verstrekken van alle gegevens aan ons, inzake dit project. De distributie van alle tekeningen en berekeningen naar de diverse instanties, zoals hoofdconstructeur, architektenburo en bouw- en woningtoezicht, vindt plaats door de opdrachtgever tenzij dit anders is afgesproken. Zodra de opdrachtgever de vloer voor akkoord heeft gegeven c.q. vrijgeeft voor fabrikage, gaan wij ervan uit dat ook eerdergenoemde instanties hun goedkeuring op de vloer hebben gegeven.

RICHTLIJNEN LEIDINGEN IN VLOER

Beoordeling van leidingen en kanalen conform categorie 4, criteria 73:
Mosatech beoordeelt leidingen en kanalen op onderstaande richtlijnen.

Risicogebieden:
- A. trapgat
- B. schacht
- C. versterkte strook
- D. oplegging van de vloer
- E. stalenligger in de vloer
- F. vloerranden + isokorven

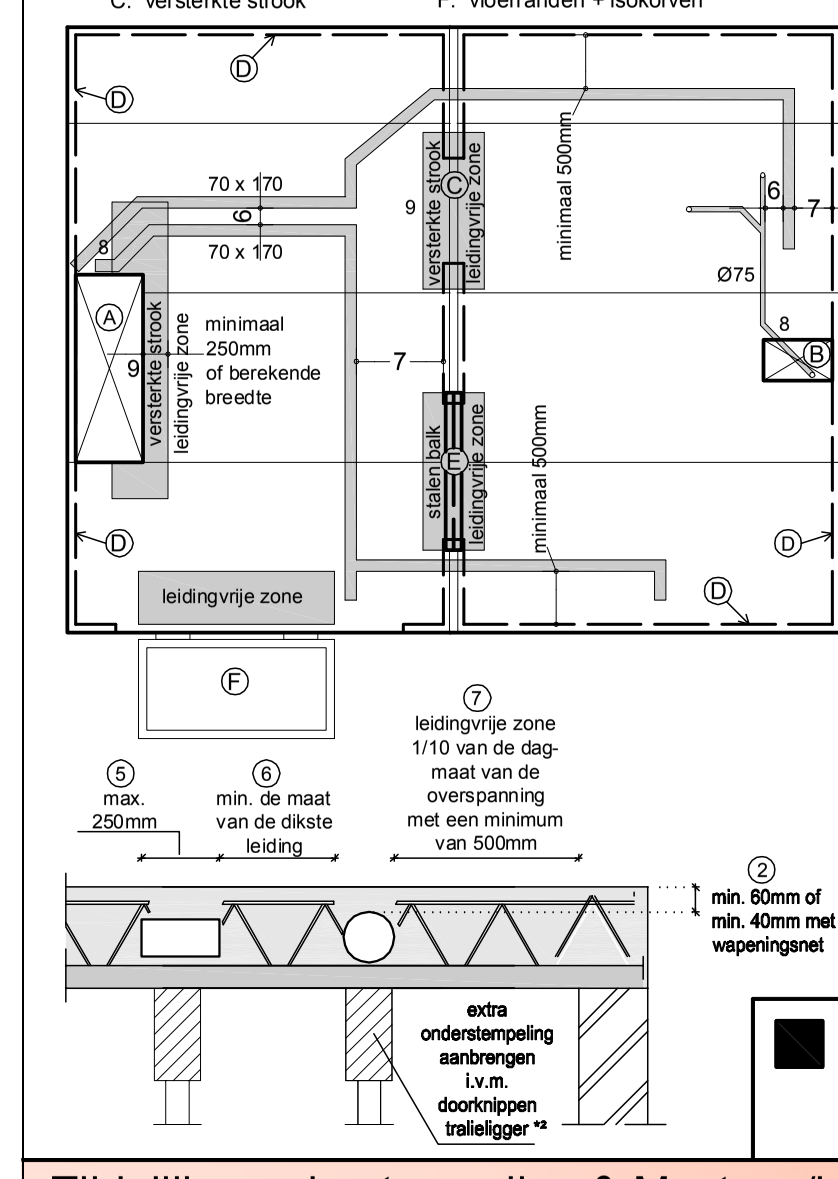
70 x 170
70 x 170
versterkte strook
leidingvrije zone
minimaal 250mm of berekende breedte
minimaal 500mm
stalen balk
leidingvrije zone
Ø75
leidingvrije zone
⑤ max. 250mm
⑥ min. de maat van de dikste leiding
⑦ leidingvrije zone 1/10 van de dagmaat van de overspanning met een minimum van 500mm
② min. 60mm of min. 40mm met wapeningsnet
extra onderstempeling aanbrengen i.v.m. doorknippen tralieligger *²

1. Maximale dikte leiding(-pakket) = vloerdikte - breedplaatdikte - 70 mm.

2.* Boven een leiding minimaal 60 mm beton of minimaal 40 mm beton met een wapeningsnet.

3. Indien het kruisen van leidingen niet voorkomen kan worden, dan de leidingen evenwijdig aan de tralieliggers in het bovenste deel van de vloer met inachtname van punt 2 en leidingen loodrecht op de tralieliggers in het onderste deel van de vloer.

4. Leidingen en bundels (electrabundels) dikker dan 50x50 mm dienen door de aannemer/installateur ter beoordeling aangegeven en gemaatvoerd en het liefst digitaal aangeleverd.
LET OP deze tekeningen dienen op ons legplan te worden aangeleverd!

5. Maximum leidingbreedte en bundelbreedte 250 mm.

6. Tussen leidingen heeft het de voorkeur om minimaal de dikte van de vloer vrij te houden. Eventueel kan de maat van de dikste leiding of dikste bundel worden vrijhouden, echter bij een tussenmaat < vloerdikte kan er extra wapening noodzakelijk zijn.

7.*¹ Naast opleggingen een leidingvrije zone van minimaal 1/10 van de dagmaat met een minimum van 500 mm aanhouden.

8. Leidingen zo snel mogelijk schuin wegleiden van schachten en trapgaten. Na aanbrengen leidingen/kokers, sparingen met druklaag dichtstorten

9. Versterkte stroken vrijhouden van leidingen.

10. Electra leidingen bij voorkeur direct op de breedplaat aanbrengen.

11. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor het tijdig en volledig aan te leveren van leidingen en het verloop hiervan.
Indien leidingen en/of kanalen niet op ons legplan zijn aangegeven en desondanks toch toegepast worden, is Mosatech Ingenieursburo niet meer verantwoordelijk voor de constructie van de vloer.

12. Meer informatie is te vinden op http://breedplaatinfo.nl/ onder Downloads (brocures)

¹=vanwege bijzondere constructies en/of zware belastingen op de vloer kunnen afwijkingen mogelijk zijn (een en ander volgens opgave)

²=alleen bij traditionele elementen is het noodzakelijk om extra onderstempeling te plaatsen.

■ LEIDINGEN ZIJN AKKOORD BEVONDEN
CONFORM TEKENING D.D.

Tijdelijke onderstempeling & Montage/hijsvoorschriften

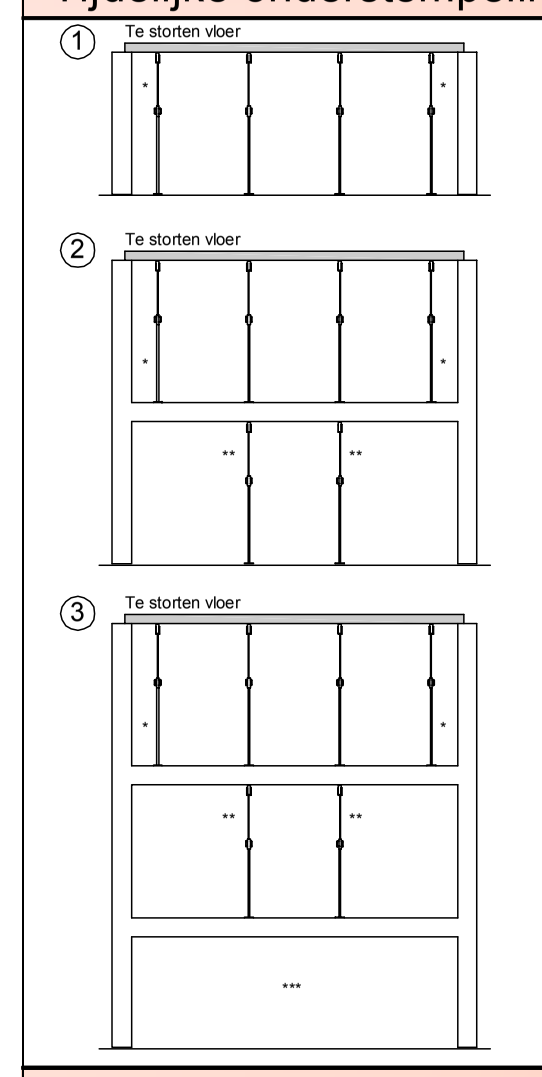

* Randondersteuningen mogen bij een gemiddelde kubusdruksterkte, van de druklaag, van tenminste 14 N/mm² worden verwijderd.

** Bij de min. gemiddelde kubusdruksterkte f'cn van 25 N/mm² tbv C20/25 en 33 N/mm² tbv eindsterkte C28/35, dient men de vloer te laten "schrikken". Schrikken = schroefstempels losdraaien en daarna weer vastdraaien vóór het aanbrengen van de tijdelijke ondersteuning van de te storten vloer, zodat de bovenliggende vloer het eigen gewicht gaat dragen en de stortbelasting kan worden overgedragen naar de onderliggende vloer(en). Ondersteuningsjukken dienen als onderstempeling. Zie NEN 6722 art. 12.11

*** Als de bovenliggende verdiepingsvloer de volledige kubusdruksterkte heeft bereikt, mogen alle onderliggende tijdelijke ondersteuningen worden verwijderd.

H.o.h. stempelrijen			
Vloer dikte	Tralie hoogte	Tralie type	Stempel afstand
240	170	8/5/5	1700

Onderstempelingsvoorschriften:

- **Bij meerdere verdiepingen onderslagen minimaal over 2 verdiepingen doorstempelen (bovenelkaar), indien vloerdikte >290mm doorstempelen over 3 verdiepingen.**
- **Voor de maximale h.o.h afstand van de tijdelijke onderstempeling zie onderstaande tabellen. Deze geldt bij minimaal 3 steunpunten en minimaal 1 stempelrij in het midden.**
- **Er dient te worden gezorgd voor voldoende (zijdelingse) stabiliteit van de tijdelijke onderstempeling.**
- **Tevens dienen t.p.v. muuropeningen, grote sparingen en indien er plaatselijk tralieliggers worden doorgeknipt t.b.v. leidingen e.d., extra onderslagen te worden toegepast.**
- **Traditionele breedplaatvloer te stellen met toog van 1/400 de overspanning.**
- **Voorgespannen breedplaatvloer te stellen met toog van 1/700 de overspanning.**
- **Bij het stellen met een toog rekening houden met de vervorming van de onderliggende constructie.**
- **Randstempel bij grote sparing / wandopening en bij een oplegging < 60mm toepassen. Maximaal 500mm uit vanaf de vloerrand.**

Montage/hijsvoorschriften:

- **Platen <6m en gewicht <2500kg hijsen met een 4-sprong.**
- **Platen >6m - <8m en gewicht <4000kg hijsen met een 6-sprong.**
- **Platen >8m of gewicht > 4000kg hijsen met een 8-sprong.**
- **Informatie mbt het hijsen van de elementen is te vinden op www.stipb.nl onder downloads (techniek).**
- **Het te storten beton moet gelijkmatig worden aangebracht, zodat opeenhopening wordt voorkomen. Stortrichting vanaf oplegging/steunpunt**
- **Montage belasting max. 0.5kN/m2**
- **Uitvoering overeenkomstig de voorschriften: NEN 6722**
- **Voor maximaal toelaatbare maatafwijking zie NEN 2889 en art 6.7.1. van NVN 6725**
- **Op tekening is aangegeven de nominale dekking vlgs. NEN 6720 art. 9.2**

LAGENNOTATIE

bovenwapening:
- 1e laag van buitenaf
- 2e laag van buitenaf
- 3e laag van buitenaf

onderwapening:
- 3e laag van buitenaf
- 2e laag van buitenaf
- 1e laag van buitenaf

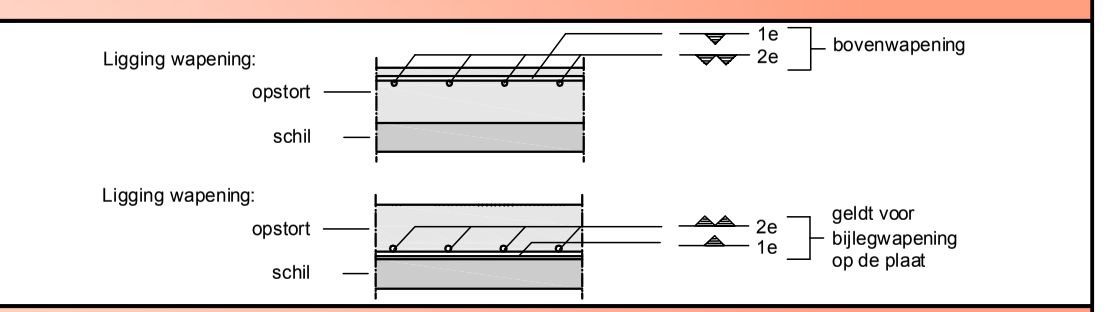

PRINCIPE DOORSNEDE

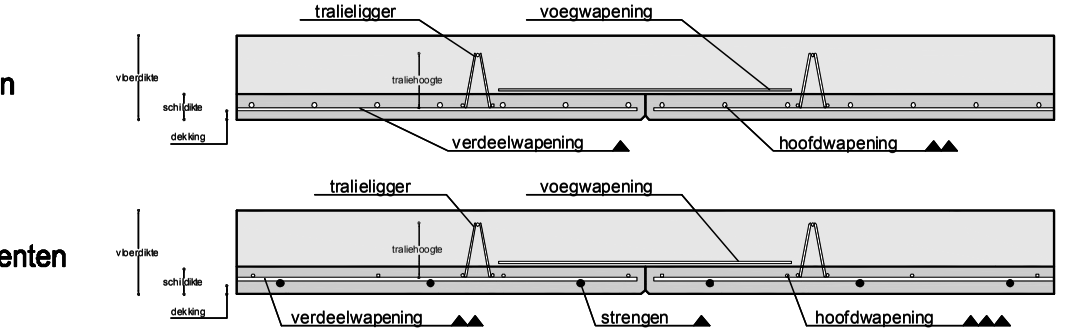

Doorsnede Traditionele elementen

Doorsnede Voorgespannen elementen

SPARINGEN

Let op:

Sparingen dienen volgens een bepaalde procedure aangeleverd te worden, zie ook de separaat bijgevoegde sparingsvoorschriften.
Wanneer deze niet strikt worden gevolgd, worden de sparingen niet voorzien.
Verantwoordelijkheid hiervoor ligt dan bij de betreffende partij welke de sparingen heeft opgegeven.

Aandachtspunten voor het aanleveren van de sparingen digitaal:
- Alle sparingen dienen te worden aangeven op het legplan van Mosatech.
- De sparingen kopieren uit de onderstaande lijst en niet verschalen, exploderen en/of van laag veranderen.
- De sparingen welke hieronder staan aangegeven, dit zijn alle sparingen welke de fabrikant op voorraad heeft en kunnen worden toegepast.

Aandachtspunten voor het aanleveren van de sparingen op witdruk:
- De op witdruk aangeleverde sparingen dienen te worden gemaatvoerd t.o.v. de door Mosatech aangegeven referentiepunten in het legplan.

- In het werk mogen sparingen alleen worden aangebracht indien er toestemming is van de hoofdconstructeur en/of bouwdirectie.

Mogelijke sparingen:

Centraaldozen	Open / Tempex	Gasbeton	Rond MV
Elektra inbouwdozen			

Belasting-gebieden	1	2	3	4	5	kN/m1 kN
Gebruikersfunctie	Wonen	Dak				
Afwerking	1.40	1.00	-	-	-	kN/m2
Scheidingswanden	0.80	0.00	-	-	-	kN/m2
Overige rust. bel.	0.00	0.00	-	-	-	kN/m2
Variabele belasting	1.75	1.88	-	-	-	kN/m2
Momentaanfactor	0.40	0.00	-	-	-	

*) g=permanent q=variabel *) Alle belastingen representatief (zonder γ)

Profiel-gegevens — Indien afwijkend aangegeven in de tekening

Vloerniveau	2850 mm	Milieuklasse boven	XC1
Vloerdikte	240 mm	Dekking boven	20 mm
Schildikte	50 mm	Milieuklasse onder	XC1
Vloertype schil	Traditioneel	Dekking onder	15 mm
Staalkwaliteit	B500A	Categorie	Woningen
Betonkwaliteit schil	C30/37	Norm	NEN-EN 1990+NB
Betonkwaliteit opstort	C20/25	Gevolgklasse	1
Cementklasse / wcf	42.5 / 0.65	Brandwerendheid	30 min

MOSATECH PREFAB B.V.
Withuis 16A, 6245 KB Eijsden.
E-mail: info@mosatech.nl
Algemeen telefoonnr: 043-3088350

Engineering werkzaamheden conform categorie 4a, criteria 73

projekt:
Woonhuis ? te Ingen

losadres:
Zevenmorgen 26 te Ingen

onderdeel:
1e verdieping
Wapening

aannemer / bouwmaterialenhandel :
/ Schoute BM BV

1ste fase	F. Vankan	d.d. 06-02-2026	gewijzigd: d.d.	d.d.
2de fase	F. Vankan	d.d. 24-03-2026	d.d.	d.d.
definitief	F. Vankan	d.d. 14-04-2026	Gecontroleerd:	schaal: 1:50

Opdrachtgever: **4+ Bouwmaterialen Groep**
fabrikant: **Oeterbeton**
productie nummer: **165149**

werknummer: 260033
bladnr: 01
onderd: W

Rechtstreekse doorkiesnummers:
Planning tekenwerk: tel. nummer:
Tekenaar: **F. Vankan** tel. nummer: **043-3088350**
Constructeur: **F.Vankan** tel. nummer: **043-3088350**

formaat: A0

Deze tekening blijft het uitsluitend eigendom van Mosatech b.v.
Auteursrechten voorbehouden.
